


БИЛТЕН бр. 31 **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА** 09.06.2019. године

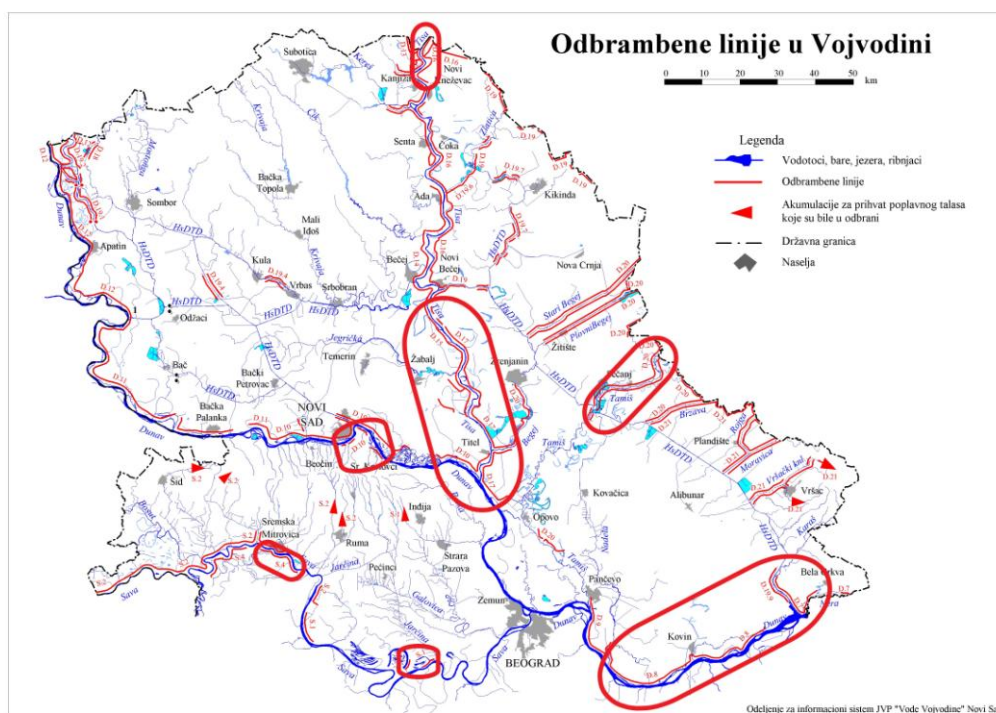

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	87,42	
Тиса	125,55	
Сава	10,22	
Канал Бегеј	3,53	
Тамиш	61,64	
Надела	2,30	
Карашац	3,53	
Укупно:	303.42	
СВЕУКУПНО:	303.42	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 08.06.2019.	ВОДОСТАЈ 09.06.2019.
Дунав	Нови Сад	450	700	552 (+2)	551 (-1)
	Панчево	530	650	596 (+8)	596 (0)
	Банатска Паланка	765	865	779(+2)	773(- 6)
	Ковин	530	650	598 (+18)	592 (-6)
	Тител	550	680	615 (+10)	619 (+4)
Сава	Шабац	400	500	440 (-4)	428 (-12)
	Прогар	350	450	381 (+5)	380 (-1)
Тиса	Нови Кнежевац	550	750	583 (+8)	588 (+5)
Тиса	Тител	550	700	615 (+10)	619 (+4)
Канал Бегеј		530	700	615 (+10)	619 (+4)
Карашац		550	700	615 (+10)	619 (+4)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	540 (+54)	568 (+28)
	Сечањ	400	650	514(+28)	552 (+38)
Надела	Панчево	530	650	596(+8)	596 (+0)
Нера	Банатска Паланка	765	865	779 (+2)	773 (-6)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.7.1. „Ушће“ – Бела Црква	
Д.7.1.1. Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до насеља Врачев Гај (5,60 км) са ободни насипом код насеља Врачев Гај (1,58 км)	7,18 km (редовна одбрана)
Д.7.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Нере (1,44 км)	1,44 km (редовна одбрана)
Д.7.1.3. Леви насип уз канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) од уставе „Кајтасово“ до ушћа канала ДТД у Дунав (8,34 км)	8,34 km (редовна одбрана)
Д.7.1.4. Десни насип уз канал Банатска Паланка – Нови	3,69 km (редовна одбрана)

Бечеј (ХС ДТД) од пута Врачев Гај – Дубовац до ХЧ „Кајтасово“ (3,69 км)	
Д.8. „Тамиш Дунав“- Панчево	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)	2,30 km (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)	11,33 km (редовна одбрана)
Д.8. „Подунавље“- Ковин	
Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)	18,02 km (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)	23,00 km (редовна одбрана)
Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабал) (20,58 км)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)	14,94 km (редовна одбрана)
Д.16. „Горњи Банат“- Кикинда	
Д.16.1.1. Леви Насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“ (24,99 км)	24,99 km (редовна одбрана)
Д.16.1.2. Летњи насип „Бала“ (6,21 км)	6,21 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)	29,57 km (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)	12,10 km (редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Бегеј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 km (редовна одбрана)
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)
Д.20. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (16,30 км)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (13,37 км)	13,37 km (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (14,23 км)	14,23 km (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ (17,74 км)	17,74 km (редовна одбрана)
С.1.4. „Источни Срем“- Земун	
С.1.4.1. Леви насип уз Саву код Кленка (1,27 км)	1,27 km (редовна одбрана)
С.1.4.2. Нови леви насип уз Саву код Кленка (2,25 км)	2,25 km (редовна одбрана)
С.1.4.3. Леви насип уз Саву Кленак - Мишар (0,36 км)	0,36 km (редовна одбрана)
С.1.3. „Источни Срем“- Земун	
С.1.3.1. Леви насип уз Саву од високог терена села Прогар до Купинова (4,45 км)	4,45 km (редовна одбрана)
С.1.3.2. Леви насип уз Саву код насења Купиново (према Обедској бари) (1,89 км)	1,89 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву, Сави и Нери у благом опадању.
- Водостаји на Тиси и Тамишу у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Ушће“ Бела Црква	Д.7.1.1. Д.7.1.2. Д.7.1.3. Д.7.1.4.	На сектору нема пријављених негативних појава.
„Тамиш Дунав“ Панчево	Д.8.1.1. Д.8.1.2.	Нису евидентиране негативне појаве.
„Подунавље“ Ковин	Д.8.1.3. Д.8.1.4.	Баласт насипа местично влажан, на круни насипа се прате постојеће водолежи.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	Изводе се радови на изградњи железничке и путне инфраструктуре у зони насипа „Липовачки“ и „Селиште“.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На делу деонице Д.10.1.2 од км 3+250 до км 6+000 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4м на 8м. На ст. км 3+250 насипа на којој се врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод, од стране Извођача радова дошло је до скидања хумуса и ископа две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Због значајних оштећења насипа и угрожене стабилности, ови радови су пријављени Водној инспекцији. Од км 3+250 – км 6+300 насипа, банкином се кретало око 50 камиона са цевима за изградњу гасовода. Постојеће водолежи се повлаче.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.15.1.1. Д.15.1.2.	Нема промена у односу на претходни дан.
„Горњи Банат“ Кикинда	Д.16.1.1. Д.16.1.2	На сектору на коме је проглашена одбрана од поплава спроводе се мере према Општем и Оперативном плану.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.1.2. Д.17.1.3. Д.17.1.4. Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	Техничка деоница Д.17.1.3 и техничка деоница Д.17.1.4 нема промена у односу на претходни дан. На делу деонице Д.17.2.2 од км 4+000 до км 6+600 и на деоници Д.17.2.4 од км 2+500 до км 1+400 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за

		снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4 на 8 м. На деоници Д.17.2.2. км 4+500 насипа врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На деоници Д.17.2.4. км 1+430 такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. Извођач радова је извршио скидање хумуса и ископ две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Раније евидентирани водолежи и проквашења су у благом порасту. Појава нових водолежи и процурења: Д.17.1.2. водолеж км 45+200 – 45+300 ширине 10 -15 м Процурење км 34+700 у ножици насипа, немерљиво.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.20.4.3. Д.20.4.5. Д.20.5.1. Д.20.5.3.	Евидентирани водолежи: Техничка деоница Д.20.4.5. ДО Тамиша од км 90+600 до км 90+560 уз брањену ножицу насипа. Техничка деоница Д.20.5.1. ЛО Тамиша од км 119+250 – 119+350 ширине 20 м; км 115+600 – 115+840 ширине 10 м. Других промена у односу на претходни дан нема.
„Источни Срем“ - Земун	С.1.4.1. С.1.4.2. С.1.4.3.	Нису евидентирани негативне појаве.
„Источни Срем“ - Земун	С.1.3.1. С.1.3.2.	Секторски руководиоца је предузео све неопходне мере предвиђене Општим и Оперативним планом на деоници.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ВПД „Подунавље“ Ковин
8. ВДП „Тамиш Дунав“ Панчево
9. ВПД „Галовица“ Земун
10. ВП „Ушће“ Бела Црква
11. ВПД „Горњи Банат“ Кикинда
12. РХМЗ Србије
13. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
14. Републички центар за обавештавање, Београд
15. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.
