


БИЛТЕН бр. 8. **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА** **26.06.2020. године**

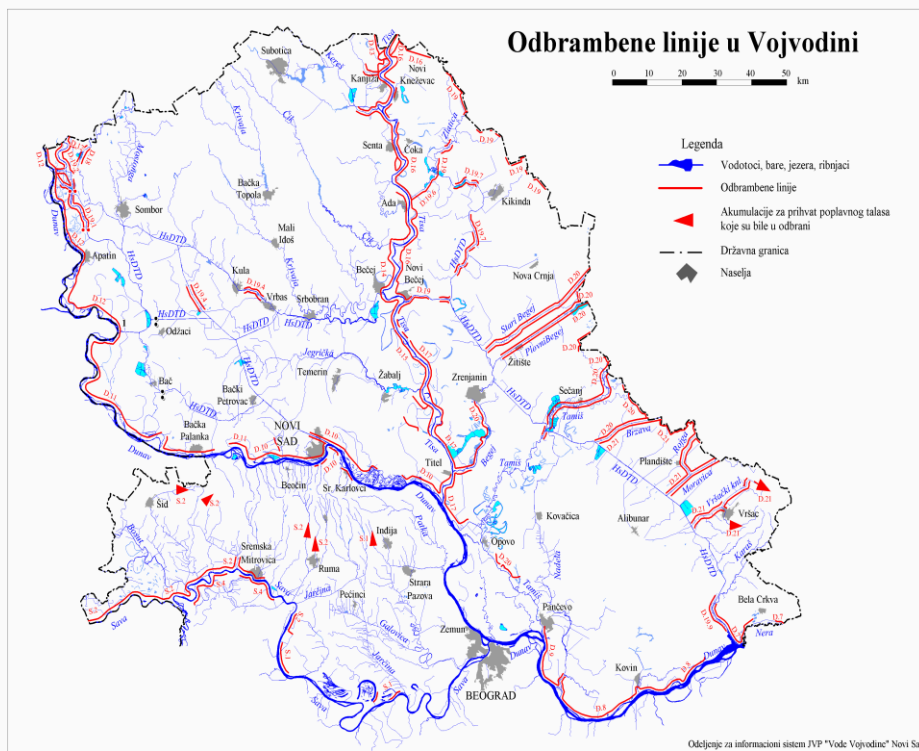

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64 Устава „Томашевац“ и „Ботош“	
Укупно:	61,64	
СВЕУКУПНО:	61,64 км	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 25.06.2020.	ВОДОСТАЈ 26.06.2020.
Тамиш	„Јаша Томић“	340	600	563 (-43)	562 (-1)
	„Сечањ“	400	650	568 (-46)	558 (-10)
Брана Месић	тело бране „Месић“	300	400	368 (-4)	358 (-10)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Јужни Банат - Вршац“, дана 26.06.2020. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 358 цм на меродавном водомеру на телу бране „Месић“, Наредбом бр. 18. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на Брани Месић:

- Д.21.5.2 Брана са акумулацијом „Месић“ на потоку Месић км 7+250

<u>Д.19. Хс ДТД – Банат</u> Д.19.11.1. устава „Томашевац“ на Тамишу и устава „Ботош“ на каналу ДТД Н.Бечеј – Б.Паланка	редовна одбрана
<u>Д.20. Средњи Банат-Зрењанин</u> Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16.30 км (113+175 – 96+870)	16,30 км (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), 13.37 км (96+870 – 83+500).	13,37 км (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14.23 км (120+375 – 106+140)	14,23 км (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), 13.37 км (96+870 – 83+500).	17,74 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Тамишу су у стагнацији и мањем опадању.
Водостаји на брани „Месић“ су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Средњи Банат –Зрењанин“	Д.19.	На снази су мере редовне одбране од поплава на уставама „Томашевац“ и „Ботош“. Објекти ОКМ ХС ДТД функционишу у складу са Правилницима за њихово функционисање у периоду спровођења одбране.
	Д.20.	На снази су мере редовне одбране од поплава на Тамишу од Томашевца до државне границе са Румунијом. У току су следећи радови: -на десној обали Тамиша код Јаше Томић настављају се радови на уређењу граничног и локализационог насипа тарупирањем дрвенасте вегетације; До сада евидентирана мања контролисана процурења код устава, раде смањеним интензитетом и прате се. На левој обали Тамиша евидентирана су нова мања процурења у ножици насипа на км 112+925, км 112+995 и на км 113+060, вода је бистра и прати се. Регистровано је проквашење у ножици насипа од км 112+900 до км 113+250 на више локалитета. До сада регистрована процурења у телу насипа раде смањеним интензитетом. На десној обали Тамиша смањен је интензитет до сада регистрованих процурења.
„Јужни Банат - Вршац“	Д.21.	Дана 26.06.2020. године укинута је редовна одбрана од поплава на Брани са акумулацијом „Месић“ на потоку Месић км 7+250.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ Зрењанин
6. Водопривредно привредно друштво „Јужни Банат“ Вршац
7. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор ХС ДТД Нови Сад
8. РХМЗ Србије
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.
