


Б И Л Т Е Н бр. 39

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

17.06.2019. године

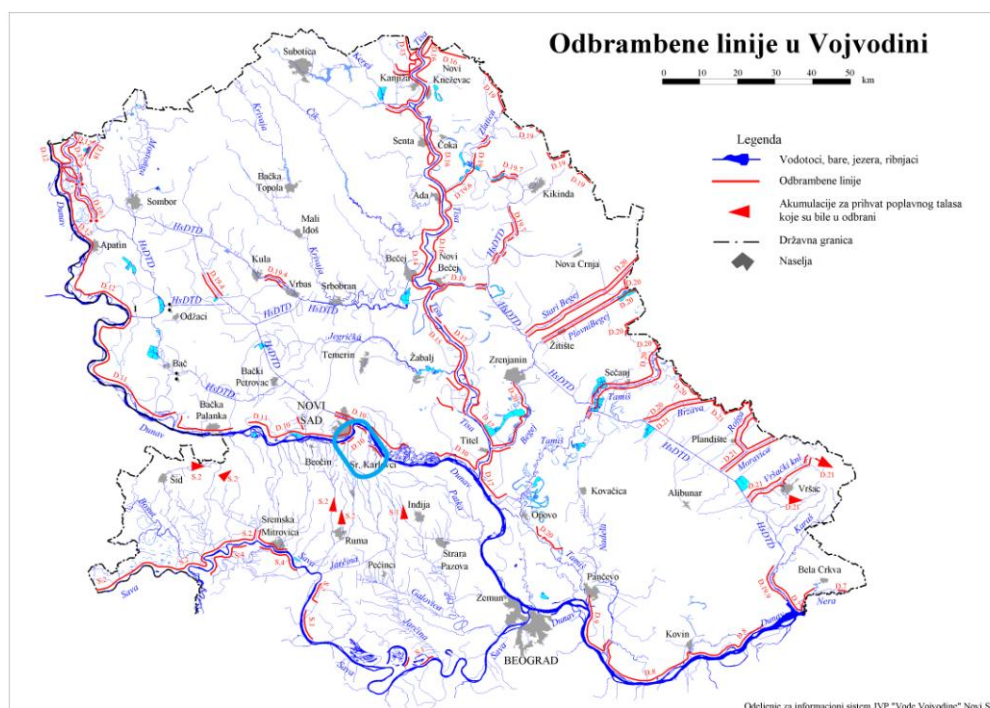

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	13,13	
Укупно:	13,13	
СВЕУКУПНО:	13,13	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 16.06.2019.	ВОДОСТАЈ 17.06.2019.
Дунав	Нови Сад	450	700	495 (-12)	485 (-10)
	Панчево	530	650	522 (-16)	502 (-20)
	Ковин	530	650	548 (-6)	536 (-12)
Тиса	Тител	550	700	544 (-21)	519 (-25)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

- Водна јединица „Подунавље“ Ковин, дана 17.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају +536 цм на меродавном водомеру „Ковин“ наредбом број 33. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.8.1.
 - Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)
 - Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)
- Водна јединица „Средњи Банат“ Зрењанин, дана 17.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају +519 цм на меродавном водомеру „Тител“ наредбом број 34. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.17.
 - Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)
 - Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)
 - Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Бегеј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)
 - Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)
 - Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)
 - Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)
 - Д.17.2.4. Десни насип уз Карашца од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)
- Водна јединица „Шајкашка“ Нови Сад, дана 17.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају +519 цм на меродавном водомеру „Тител“ наредбом број 35. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.10. и Д.15.
 - Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)
 - Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)
 - Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабаљ) (20,58 км)
 - Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)
- Водна јединица „Тамиш Дунав“ Панчево, дана 17.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају +502 цм на меродавном водомеру „Панчево“ наредбом број 36. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.8.1.
 - Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)

- Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)

Д.8. „Тамиш Дунав“- Панчево	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)	2,30 km (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)	11,33 km (редовна одбрана)
Д.8. „Подунавље“- Ковин	
Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)	18,02 km (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)	23,00 km (редовна одбрана)
Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.15. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабаљ) (20,58 км)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)	14,94 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)	29,57 km (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)	12,10 km (редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Бегеј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 km (редовна одбрана)
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву и Тиси су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Тамиш Дунав“ Панчево	Д.8.1.1. Д.8.1.2.	Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
„Подунавље“ Ковин	Д.8.1.3. Д.8.1.4.	Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	Код уставе „Пруд“, део тела насипа „Селиште“ се користи као позајмиште материјала за изградњу путне и железничке инфраструктуре код Сремских Карловаца.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На деоници насипа Д.10.1.2 од км 3+250 до км 6+000 у току су радови на изградњи гасовода за „интерконејцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови.

		На стационачи км 3+250 насипа врше се радови на подбушивању испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови. У последња 24 сата на градилишту нису извођени радови.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.15.1.1. Д.15.1.2.	На стационачи км 39+500 где су евидентирани јазавичје рупе, дошло је до улегнућа косине насипа површине 0,5 м ² , дубине 30 – 40 цм.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.1.2. Д.17.1.3. Д.17.1.4. Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	На насипу Д.17.1.2 евидентирана водолеж км 30+300 – 30+600, ширине 10 м. На деоници Д.17.1., објектима Д.17.1.3 и Д.17.1.4 нема регистрованих нових негативних појава. На делу насипа Д.17.2.2 од стационаче км 4+000 до км 6+600 и на делу насипа Д.17.2.4 од стационаче км 2+500 до км 1+400, у току су радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови. На делу насипа Д.17.2.2., на стационачи км 4+500, врше се радови на подбушивању испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На делу насипа Д.17.2.4. на стационачи км 1+430, такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ВПД „Подунавље“ Ковин
8. ВДП „Тамиш Дунав“ Панчево
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, Београд
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.
