


Б И Л Т Е Н бр. 36 **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**

14.06.2019. године

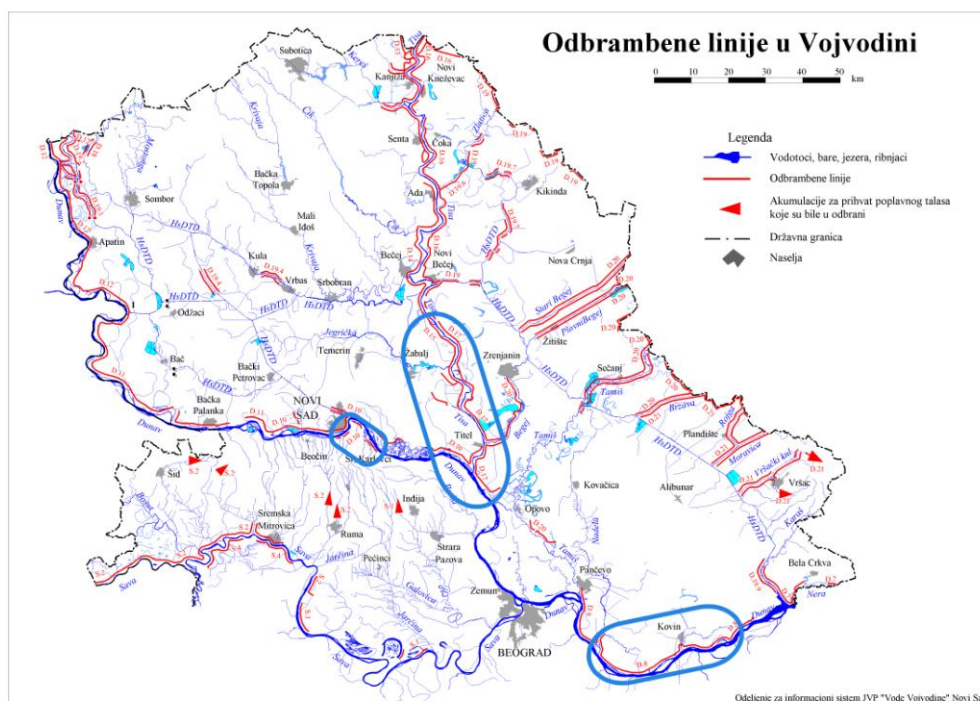

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	86,36	
Тиса	94,35	
Канал Бегеј	12,76	
Надела	2,30	
Карашац	3,53	
Укупно:	199,30	
СВЕУКУПНО:	199,30	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 13.06.2019.	ВОДОСТАЈ 14.06.2019.
Дунав	Нови Сад	450	700	530 (-6)	518 (-12)
	Панчево	530	650	564 (-11)	553 (-11)
	Ковин	530	650	566 (-4)	562 (-4)
Тиса	Тител	550	700	596 (-10)	584 (-12)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.8. „Тамиш Дунав“- Панчево	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)	2,30 km (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)	11,33 km (редовна одбрана)
Д.8. „Подунавље“- Ковин	
Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)	18,02 km (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)	23,00 km (редовна одбрана)
Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.15. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабалъ) (20,58 км)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)	14,94 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)	29,57 km (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)	12,10 km (редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Бегеј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 km (редовна одбрана)
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву и Тиси су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Тамиш Дунав“ Панчево	Д.8.1.1. Д.8.1.2.	Нису евидентиране негативне појаве.
„Подунавље“ Ковин	Д.8.1.3. Д.8.1.4.	Нема негативних појава на одбрамбеној линији.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	Изводе се радови на изградњи железничке и путне инфраструктуре у зони насипа „Липовачки“ и „Селиште“ у Сремским Карловцима.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На делу деонице Д.10.1.2 од км 3+250 до км 6+000 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4м на 8м. На ст. км 3+250 насипа на којој се врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод, од стране Извођача радова дошло је до скидања хумуса и ископа две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Због значајних оштећења насипа и угрожене стабилности, ови радови су пријављени Водној инспекцији. У последња 24 сата на градилишту нису извођени радови. Постојеће водолежи су у стагнацији и опадању.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.15.1.1. Д.15.1.2.	Постојеће водолежи су у стагнацији и опадању.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.1.2. Д.17.1.3. Д.17.1.4. Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	Техничка деоница Д.17.1.3 и техничка деоница Д.17.1.4 нема промена у односу на претходни дан. На делу деонице Д.17.2.2 од км 4+000 до км 6+600 и на деоници Д.17.2.4 од км 2+500 до км 1+400 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4 на 8 м. На деоници Д.17.2.2. км 4+500 насипа врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На деоници Д.17.2.4. км 1+430 такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. Извођач радова је извршио скидање хумуса и ископ две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Д.17.1.2. Раније евидентиране водолежи и процурења на деоницама Д.17.1.2., Д.17.1.3. и Д.17.1.4. су без промена.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ВПД „Подунавље“ Ковин
8. ВДП „Тамиш Дунав“ Панчево
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, Београд
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.
