


Б И Л Т Е Н бр. 38 **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**

16.06.2019. године

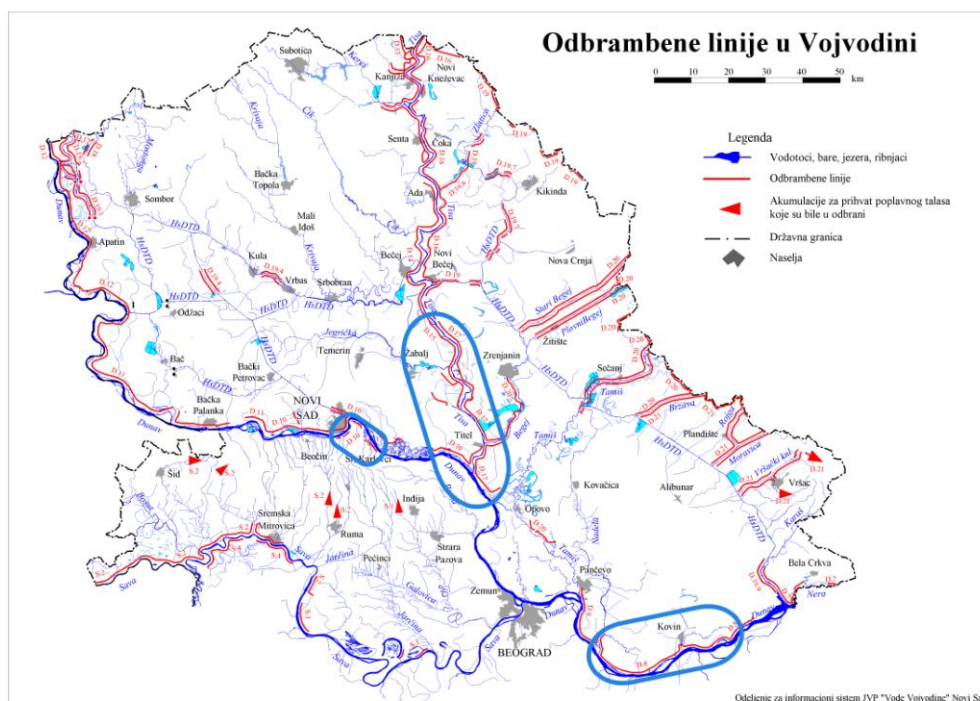

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	86,36	
Тиса	94,35	
Канал Бегеј	12,76	
Надела	2,30	
Карашац	3,53	
Укупно:	199,30	
СВЕУКУПНО:	199,30	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 15.06.2019.	ВОДОСТАЈ 16.06.2019.
Дунав	Нови Сад	450	700	507 (-11)	495 (-12)
	Панчево	530	650	538 (-15)	522 (-16)
	Ковин	530	650	554 (-8)	548 (-6)
Тиса	Тител	550	700	565 (-19)	544 (-21)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.8. „Тамиш Дунав“- Панчево	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)	2,30 km (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)	11,33 km (редовна одбрана)
Д.8. „Подунавље“- Ковин	
Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)	18,02 km (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)	23,00 km (редовна одбрана)
Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.15. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабалъ) (20,58 км)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)	14,94 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)	29,57 km (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)	12,10 km (редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Бегеј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 km (редовна одбрана)
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву и Тиси су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Тамиш Дунав“ Панчево	Д.8.1.1. Д.8.1.2.	Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
„Подунавље“ Ковин	Д.8.1.3. Д.8.1.4.	Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	Изводе се радови на изградњи железничке и путне инфраструктуре у зони насипа „Липовачки“ и „Селиште“ у Сремским Карловцима.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На деоници насипа Д.10.1.2 од км 3+250 до км 6+000 у току су радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови. На стационажи км 3+250 насипа врше се радови на подбушивању испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови. У последња 24 сата на градилишту нису извођени радови.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.15.1.1. Д.15.1.2.	Постојеће водолежи су у стагнацији.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.1.2. Д.17.1.3. Д.17.1.4. Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	На насипу Д.17.1.2 нема евидентираних нових негативних појава, у односу на претходни дан без значајних промена. У току су радови на кошењу насипа у оквиру програма редовног одржавања. На деоници Д.17.1., објектима Д.17.1.3 и Д.17.1.4 нема регистрованих нових негативних појава. На делу насипа Д.17.2.2 од стационаже км 4+000 до км 6+600 и на делу насипа Д.17.2.4 од стационаже км 2+500 до км 1+400, у току су радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови. На делу насипа Д.17.2.2., на стационажи км 4+500, врше се радови на подбушивању испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На делу насипа Д.17.2.4. на стационажи км 1+430, такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. Нису пријављена нова оштећења насипа и принасипског појаса, наставити појачано осматрање локација где се изводе радови.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ВПД „Подунавље“ Ковин
8. ВДП „Тамиш Дунав“ Панчево
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, Београд
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.
