


Б И Л Т Е Н бр. 37 **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**

15.06.2019. године

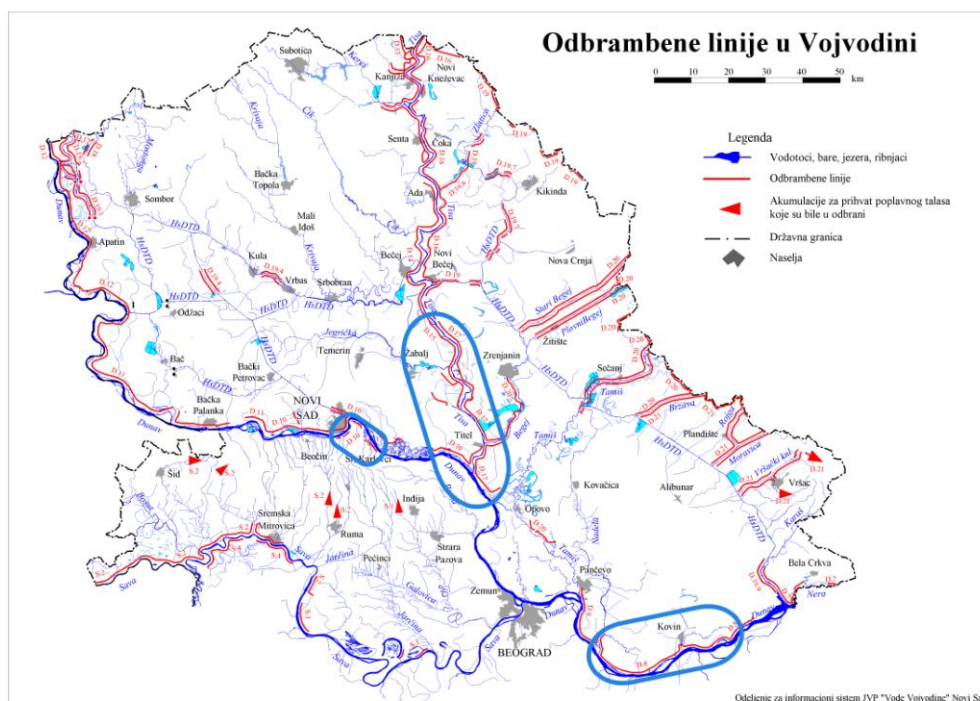

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	86,36	
Тиса	94,35	
Канал Бегеј	12,76	
Надела	2,30	
Карашац	3,53	
Укупно:	199,30	
СВЕУКУПНО:	199,30	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 14.06.2019.	ВОДОСТАЈ 15.06.2019.
Дунав	Нови Сад	450	700	518 (-12)	507 (-11)
	Панчево	530	650	553 (-11)	538 (-15)
	Ковин	530	650	562 (-4)	554 (-8)
Тиса	Тител	550	700	584 (-12)	565 (-19)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.8. „Тамиш Дунав“- Панчево	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)	2,30 km (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)	11,33 km (редовна одбрана)
Д.8. „Подунавље“- Ковин	
Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)	18,02 km (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)	23,00 km (редовна одбрана)
Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.15. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабалъ) (20,58 км)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)	14,94 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)	29,57 km (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)	12,10 km (редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Бегеј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 km (редовна одбрана)
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву и Тиси су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Тамиш Дунав“ Панчево	Д.8.1.1. Д.8.1.2.	Нису евидентиране негативне појаве.
„Подунавље“ Ковин	Д.8.1.3. Д.8.1.4.	Нема негативних појава на одбрамбеној линији.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	Изводе се радови на изградњи железничке и путне инфраструктуре у зони насипа „Липовачки“ и „Селиште“ у Сремским Карловцима.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На деоници насипа Д.10.1.2 од км 3+250 до км 6+000 у току су радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. До сада регистрована оштећења на насипу и принасипском појасу су без промена у односу на предходни дан и појачано се осматрају. На стационажи км 3+250 насипа врше се радови на подбушивању испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. До сада регистрована оштећења насипа и принасипског појаса су без промена у односу на предходни дан и појачано се осматрају. У последња 24 сата на градилишту нису извођени радови. До сада регистроване водолежи су се повукле.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.15.1.1. Д.15.1.2.	Постојеће водолежи су у стагнацији.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.1.2. Д.17.1.3. Д.17.1.4. Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	На деоници насипа Д.17.1.2 регистровано је проквашење у ножици насипа у принасипском појасу од км 44+800 до км 44+950. На деоницама насипа Д.17.1.3 и Д.17.1.4 нема регистрованих нових негативних појава. На деоници насипа Д.17.2.2 од км 4+000 до км 6+600 и на деоници Д.17.2.4 од км 2+500 до км 1+400, у току су радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. До сада регистрована оштећења на насипу и принасипском појасу су без промена у односу на предходни дан и појачано се осматрају. На деоници насипа Д.17.2.2., на км 4+500, врше се радови на подбушивању испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На деоници Д.17.2.4. на км 1+430, такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. До сада регистрована оштећења насипа и принасипског појаса су без промена у односу на предходни дан и појачано се осматрају.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ВПД „Подунавље“ Ковин
8. ВДП „Тамиш Дунав“ Панчево
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, Београд
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белаш, дипл.инж.
